บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดบางยิ่ว - บ้านนายวัน นศ.ถ. 51-005 หมู่ที่ 3 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,240 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จำนวน 308 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 5,190,000 บาท

งบประมาณสมทบ .....-..... บาท

หน่วยดำเนินการ อปท. เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการตรวจสอบ

☑ ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน

☐ ไม่ถูกต้อง

สรุป

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบโครงการ

((นายชิตชนก ชนะกุล))

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หมายเหตุ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ที่จังหวัดแต่งตั้ง เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ

(แบบคำขอ 1 ฉบับ ต่อ 1 โครงการ)

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
(ถนนถ่ายโอนภารกิจและถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดบางยิ่ว - บ้านนายวัน (นศ.ถ. 51-005) หมู่ที่ 3 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ 5,190,000 **บาท**

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 รายละเอียดโครงการ (เลือกโครงการเพียง 1 ประเภท พร้อมระบุรายละเอียดโครงการ)

☑ ก่อสร้าง ☐ ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว/ซ่อมสร้าง

โครงการถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระบุชนิดถนน) **รหัสทางหลวงท้องถิ่น** นศ.ถ. 51-005

สายทาง....โรงเรียนวัดบางยิ่ว – บ้านนายวัน....

(หมายเหตุ ถ้าเป็นถนนถ่ายโอนให้ระบุ ซ่อมสร้าง หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั้น)

1.2 ประเภทถนน ✓เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

☐ ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

หน่วยงานที่ถ่ายโอน.....

วันที่ที่ได้รับถ่ายโอน ว/ด/ป.....

☑ ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ชื่อบ้าน บ้านบางยิ่ว ตำบล การะเกด อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

พิกัดที่ตั้ง : เริ่มต้น N 8.111642 E 100.132327

สิ้นสุด N 8.124861 E 100.125764

1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลการะเกด

อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

1.5 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5,190,000 บาท

เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลสมทบ - บาท

(ระบุงบประมาณไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และต่ำกว่า 10,000,000 บาท กรณีที่ขอเกิน 10,000,000 บาท เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสมทบโครงการดังกล่าว)

1.6 ยอดเงินสะสม 18,731,577.06 บาท ยอดเงินสะสมสุทธิ 6,672,123.29 บาท

หมายเหตุ : ยอดเงินสะสม คือ เงินสะสมของหน่วยงานทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

ยอดเงินสะสมสุทธิ คือ เงินสะสมของหน่วยงานที่หักหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วสามารถนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน

1.7 รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)

(1) ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 23,346,452.37 บาท (รายได้จริง)

(2) ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 22,574,290.43 บาท (รายได้จริง)

(3) ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 27,000,000 บาท (ประมาณการรายได้)

1.8 โครงการ / งบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)

(1) ปี พ.ศ. 2565 จำนวน - โครงการ - บาท

(2) ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ 8,823,700 บาท

(3) ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ 8,296,000 บาท

1.9 แผนการดำเนินงาน / โครงการที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน เริ่มต้น เดือน/ปี ต.ค. 2567 สิ้นสุด เดือน/ปี มี.ค. 2568

ลำดับ	รายละเอียด/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
		เริ่มต้น (เดือน/ปี)	สิ้นสุด (เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. 2567	ต.ค. 2567
2	จัดทำราคากลาง	พ.ย. 2567	พ.ย. 2567
3	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย. 2567	พ.ย. 2567
4	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
5	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ธ.ค. 2567	ธ.ค. 2567
6	ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง	ธ.ค. 2567	ม.ค. 2568
7	เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ	ม.ค. 2568	-
8	ก่อสร้าง / ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	มี.ค. 2568

1.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณทั้งสิ้น 5,190,000 บาท

ไตรมาสที่ 1 จำนวนรวม - บาท

ไตรมาสที่ 2 จำนวนรวม 5,190,000 บาท

ไตรมาสที่ 3 จำนวนรวม - บาท

ไตรมาสที่ 4 จำนวนรวม - บาท

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
						5.1900					

1.11 **ผู้ประสานงานโครงการ** นายชรินทร์ เมืองจีน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0 7545 0552 ต่อ 104 โทรสาร 0 7545 0552 ต่อ 108

E-mail .....

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อพัฒนาเส้นทางให้เกษตรกรใช้เส้นทางในการขนส่งวัตถุดิบปัจจัยการผลิต

2) เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้เส้นทางในการสัญจร

3) เพื่อรองรับการขยายตัวของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน

2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ

ตามที่ สำนักงบประมาณ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาระบบรองรับการกระจายสินค้าพัฒนาสินค้าเกษตรการบริหารจัดการน้ำและบริการทางการเกษตร ภายใต้หลักโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนงานพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และบริหารจัดการด้านการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตร โดยพัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลและปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในการใช้เส้นทาง นั้น ภายใต้แนวทางการปฏิบัติของจังหวัดกลุ่มจังหวัด ดังที่กล่าวมา ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ตำบลการะเกด ซึ่งยังคงประสบปัญหาโดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมสัญจร ซึ่งยังมิได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางหลักของพื้นที่ จึงสอดรับกับแนวทางและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชน

2.3 ที่มาของโครงการ (ระบุปัญหา ความต้องการ หรือความจำเป็น)

ด้วย ถนนสายโรงเรียนวัดบางยิ่ว - บ้านนายวัน เป็นถนนสายหลักซึ่งมีความสำคัญของพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นทั้งเส้นหลักและสำคัญมากในการคมนาคมสัญจร มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นจำนวนมากและมีการใช้สัญจรของนักเรียนในพื้นที่ และยังเป็นเส้นทางสำหรับการใช้ลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ได้มีการเสนอให้มีการบรรจุโครงการในการก่อสร้างให้เป็นถนนที่มีความมั่นคง แข็งแรง จึงมี

แนวคิดในการผลักดันให้มีการดำเนินจัดทำถนนให้มีมาตรฐาน โดยการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันถนนสายนี้ยังคงเป็นถนนหินคลุกและผสมดินลูกรัง ในช่วงฤดูฝนมีการชำรุดเสียหายเป็นประจำ หากถนนสายนี้ได้รับการพิจารณาให้มีการก่อสร้างเป็นถนนที่มีมาตรฐานจะสามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคม สัญจรให้แก่ประชาชน,เด็กนักเรียน และการพัฒนาเส้นทางการขนส่งในภาคเกษตรกรรมที่สำคัญมาก ก่อให้เกิดให้การลำเลียงผลผลิตโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันได้รวดเร็วสะดวก เป็นปัจจัยส่งเสริมด้านราคาและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.4 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับประโยชน์ของโครงการ

ประชาชนหมู่ที่ 3,5 ชื่อบ้าน บ้านบางยิ่ว , บ้านการะเกด

ครัวเรือนและประชาชนผู้รับประโยชน์ จำนวน 152 ครัวเรือน จำนวน 542 คน

(กรณีผู้รับประโยชน์มีหลายหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ระบุจำนวนรวม)

2.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบางยิ่ว - บ้านนายวัน - (นศ.ถ. 51-005) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 308 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

2.6 ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)

โปรดระบุ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,240 ตารางเมตร

3. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา (ระดับท้องถิ่น / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

3.1 (✓) แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3.2 (✓) แผนพัฒนาจังหวัด ข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการกระจายสินค้าทางการเกษตร

3.3 (✓) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพร และพัทลุง) เรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

3.4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

4. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (ระดับชาติ / รัฐบาล / กระทรวง)

4.1 (✓) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4.2 (✓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

4.3 ( ) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ ..... เรื่อง .....

4.4 (✓) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์)

4.5 ( ) มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่ ..... เรื่อง .....

4.6 ( ) นโยบาย/ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เรื่อง .....

4.7 ( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

5. ขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมของแบบรายการความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ และสามารถดำเนินการได้ทันที

6. ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ) .....
(นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

7. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวปราณี เยาว์ดำ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลการะเกด

8. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ) .....
(นายทรงวุฒิ โสมจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด

แบบ ปร.๕

บัญชีแสดงปริมาณ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดบางยิ่ว - บ้านนายวัน นศ.ถ. ๕๑-๐๐๕ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จำนวน ๓๐๘ ลบ.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางยิ่ว หมู่ที่ ๓ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๓,๖๙๗,๒๗๕.๘๖	
ค่า FACTOR = ๑.๔๐๕๔	๕,๑๙๖,๑๕๑.๔๙	
เป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๕,๑๙๖,๑๕๑.๔๙	
คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้นเพียง	๕,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	
(-ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)		

คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น **๕,๑๙๐,๐๐๐.๐๐** **บาท**
(-ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รก.ในตำแหน่ง ผอ. กองช่าง
(นายปรีชาชาญ แก้วนุ้ย)

(ลงชื่อ) ปลัดเทศบาล
(นางสาวปราณี เยาว์ดำ)

(ลงชื่อ) นายกเทศมนตรีตำบลการะเกด
(นายทรงวุฒิ โสมจันทร์)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดบางยิ่ว - บ้านนายวัน - (นศ.ถ. ๕๑-๐๐๕) หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จำนวน ๓๐๘ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางยิ่ว หมู่ที่ ๓ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน ราคาน้ำมันโซล่า ราคาลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นทางเดิม	๘,๒๔๐	ตรม.	-	-	๑.๗๔	๑๔,๓๓๗.๖๐	๑๔,๓๓๗.๖๐	
๒	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๔๑๒	ลบ.ม.	๓๒๐.๐๐	๑๓๑,๘๔๐.๐๐	๑๕.๐๐	๖,๑๘๐.๐๐	๑๓๘,๐๒๐.๐๐	
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ กก./ตร.ม.	๑,๒๓๖	ลบ.ม.	๒,๒๕๕.๑๔	๒,๗๘๗,๓๕๓.๐๔	๒๓๐.๐๐	๒๘๔,๒๘๐.๐๐	๓,๐๗๑,๖๓๓.๐๔	
๔	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	๘,๒๔๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	
	Ø ๖ มม. ๐.๒๐ ม.x ๐.๒๐ ม.				-		-	-	
	- เหล็ก RB ๑๙ มม.	๑๖	เส้น	๔๓๔.๔๐	๖,๙๕๐.๔๐	-	-	๖,๙๕๐.๔๐	
	- เหล็ก RB ๑๕ มม.	๘๒	เส้น	๒๘๐.๓๗	๒๒,๙๙๐.๓๔	-	-	๒๒,๙๙๐.๓๔	
๕	งานวัสดุหินคลุก	๓๐๘	ลบ.ม.	๓๖๙.๕๖	๑๑๓,๘๒๔.๔๘	๑๕.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๑๑๘,๔๔๔.๔๘	
๖	ยางมะตอย	๘๕	ลิตร	๒๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๑,๗๐๐.๐๐	
๗	งานไม้แบบ (เหมารวม)	๑	งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๘	งานรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต	๒,๒๐๐	ตรม.	-	-	๓๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น								๓,๖๙๗,๒๗๕.๘๖	
(-สามล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์-)									

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชรินทร์ เมืองจีน)


นายช่างโยธาชำนาญงาน


รูปถ่ายสภาพสถานที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดบางยิ่ว - บ้านนายวัน นศ.ถ. 51-005 หมู่ที่ 3 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

<u>จุดเริ่มต้นโครงการ</u>



<u>จุดสิ้นสุดโครงการ</u>

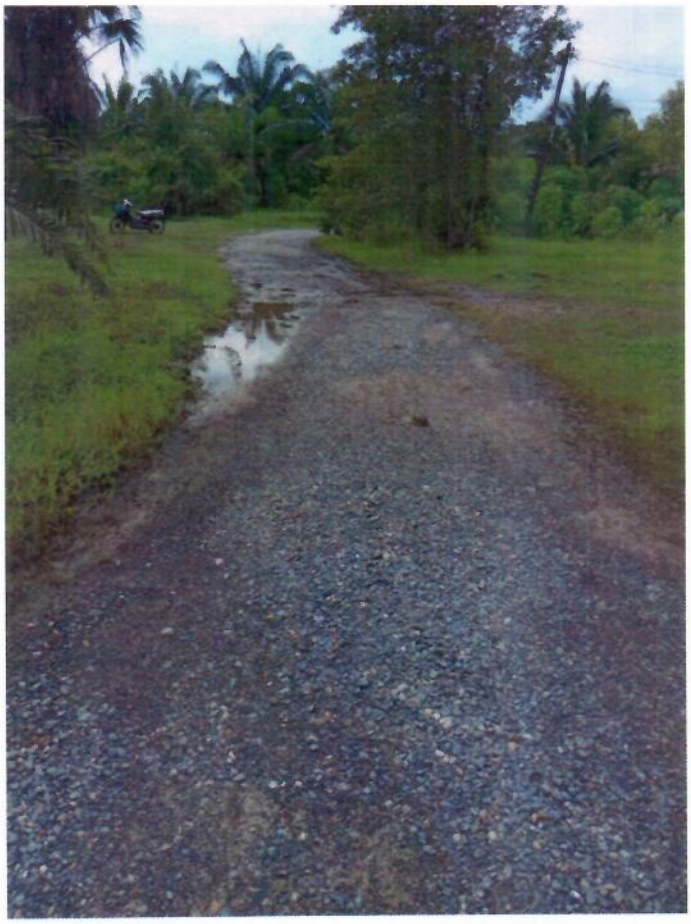

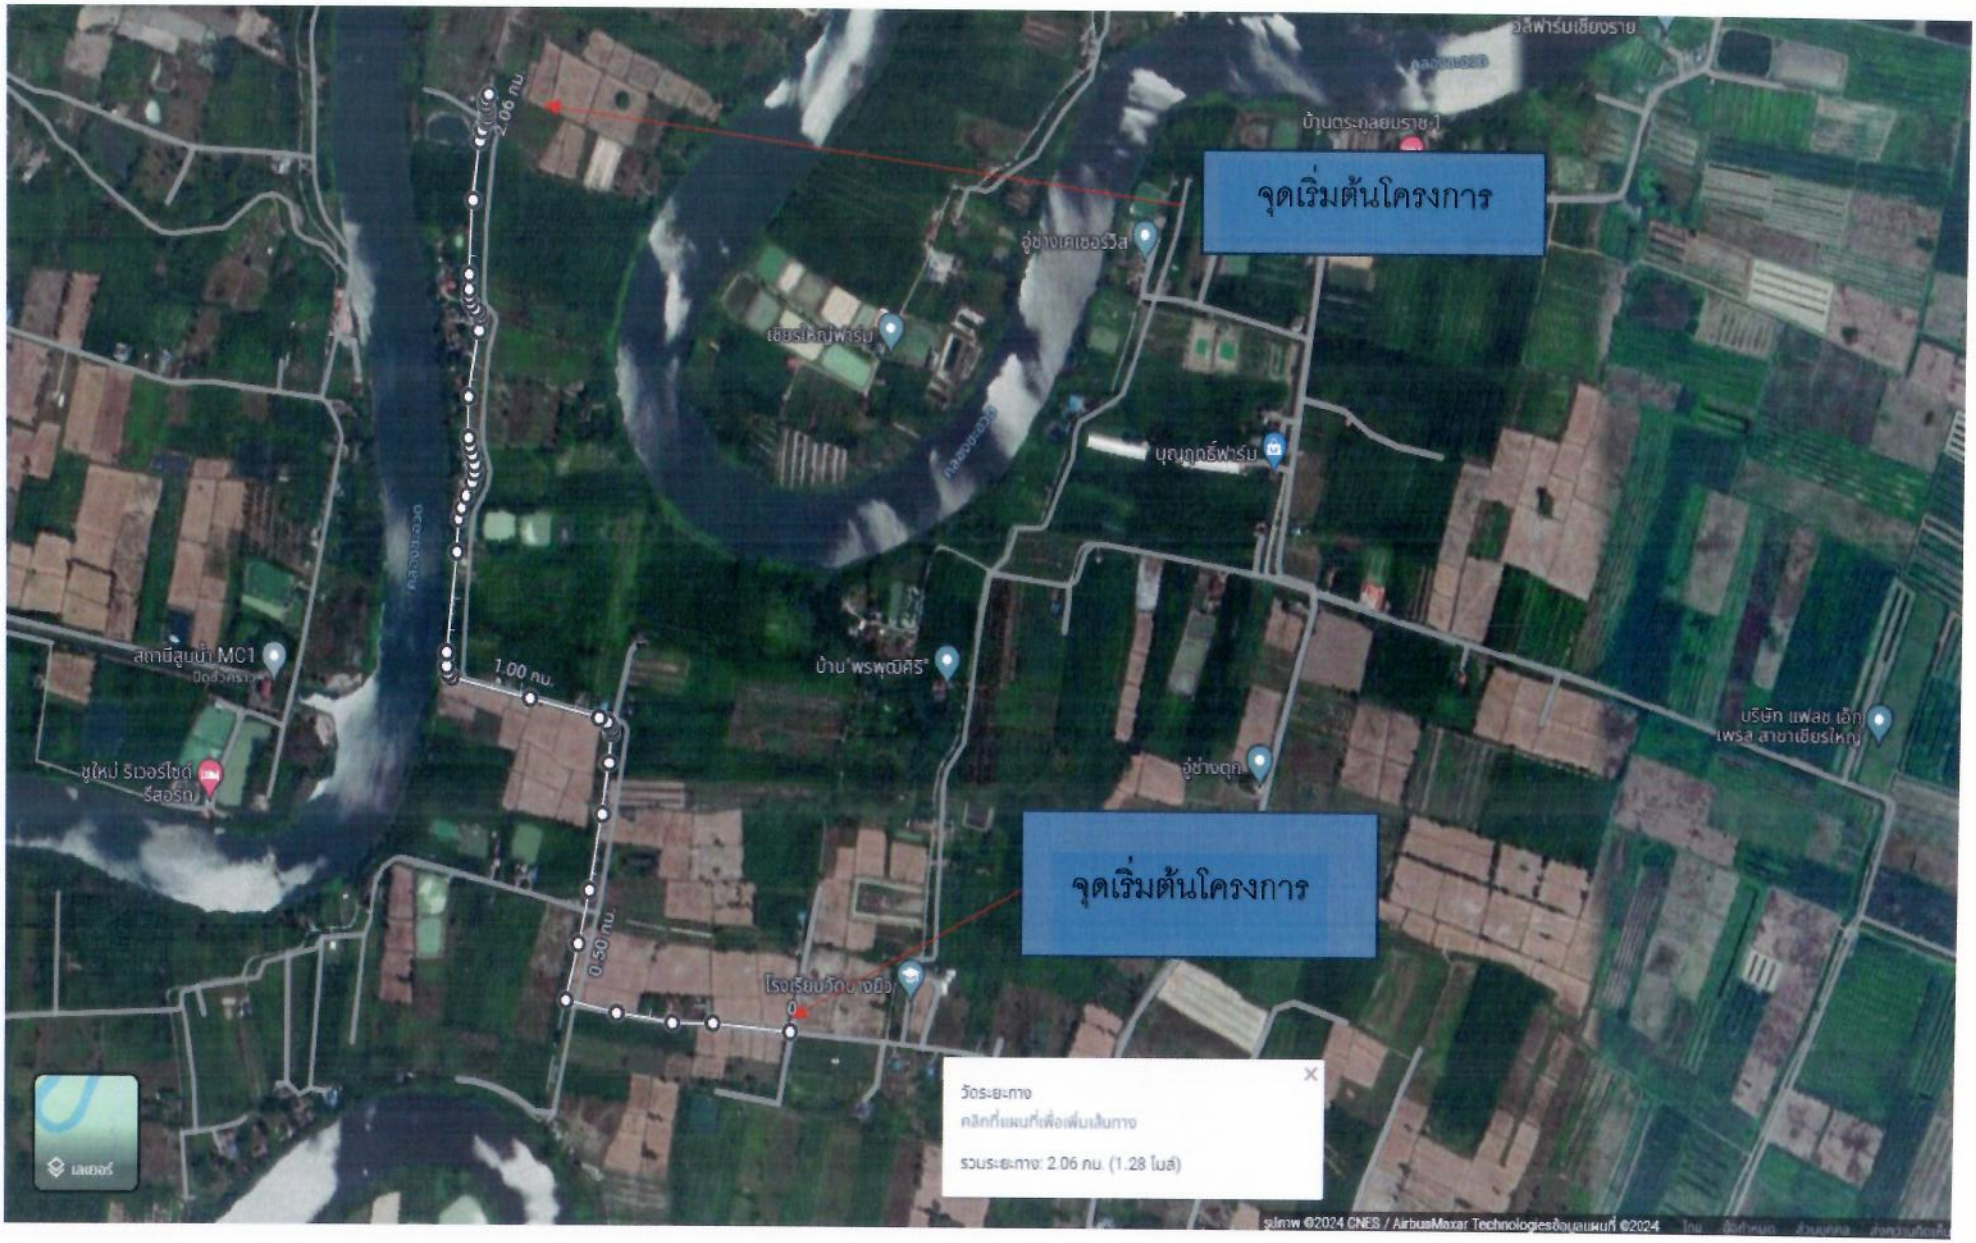
จุดเริ่มต้นโครงการ
จุดเริ่มต้นโครงการ
2.06 กม.
1.00 กม.
0.50 กม.
วัดระยะทาง
คลิกที่แผนที่เพื่อเพิ่มเส้นทาง
รวมระยะทาง: 2.06 กม. (1.28 ไมล์)
เลเยอร์
รูปภาพ ©2024 CNES / Airbus Maxar Technologies ข้อมูลแผนที่ ©2024

บัญชีรายละเอียดแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ข้อความเดิม)	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ข้อความใหม่)	เหตุผลความจำเป็น
๑	**แบบ** ผ.๐๒/๒ **ยุทศาสตร์**ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ **กลยุทธ์** จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (๑) **แผนงาน** : อุตสาหกรรมและการโยธา **เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น** (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ หน้า ๑๙๐ ลำดับที่ ๒๒ (ฉบับเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓)	**โครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายร.ร.วัดบางยิ่ว – บ้านนายวัน (นศ.ถ๕๑ - ๐๐๕) หมู่ที่ ๓ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งได้สะดวก **เป้าหมาย** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม.) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด **ปีงบประมาณ** : ๒๕๖๗ **จำนวนเงิน** : ๕,๑๘๔,๐๐๐ บาท	**โครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายร.ร.วัดบางยิ่ว – บ้านนายวัน (นศ.ถ๕๑ - ๐๐๕) หมู่ที่ ๓ **วัตถุประสงค์ :** เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งได้สะดวก **เป้าหมาย** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.) พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม.) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด **ปีงบประมาณ** : ๒๕๖๘ **จำนวนเงิน :** ๕,๒๑๔,๐๐๐ บาท	แก้ไขเพื่อให้ปีตรงกับปีที่จะดำเนินการ ข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และงบประมาณให้สอดคล้องกับประมาณการค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

ส.ต. สามารถ

(สามารถ มีหมื่นพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
